

工事だより：H31.1月号 九州新幹線の建設発生土を活用した企業立地用地整備に係る田中町地内造成工事について 【鉄道・運輸機構】

関係者の皆様、新年明けまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。  
又、平素より造成工事に対してご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
「工事だより」H31.1月号を発行いたします。  
本号では1月以降の工事予定及び残土搬入予定についてお知らせさせていただきます。  
12月末時点で約544,570m<sup>3</sup>の盛土が完了し、引続き新幹線工事の発生土による造成工事が主体となります。  
騒音への配慮を継続すると共に、今期は好天が続いており、引続き場内散水による粉塵対策を行います。  
昨年、10月より工事施工会社が西松JVから鉄建JVに変わり施工を行っております。  
今後とも地域の皆様にご迷惑をお掛けする事と存じますが、工事へのご協力とご理解をお願い申し上げます。

1. 工事計画

1月以降の工事計画について、引き続きを新幹線工事発生土を使用した盛土造成工事を行う予定です。  
工事箇所は、将来卸団地とのアクセス道路となる西側取付け道路が主体となります。また、盛土工事の進捗に  
合わせ、防災工事として、雨水や湧水进行处理するための排水工事を行う予定です。  
各残土搬出工区の工程や天候により、造成工事の工程に変更の場合もございますが、ご了承願います。

2. 工事工程表

| 工事内容         |                     | 30年  | 31年             |                 |                 |                 |                                             | 記 事 |
|--------------|---------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----|
|              |                     | 12月迄 | 1月              | 2月              | 3月              | 4月              |                                             |     |
| 造成工事<br>(南側) | 発生土搬入【盛土造成】         |      |                 |                 |                 |                 | 新幹線工事の発生土による盛土造成工事及び西側の取付け道路の盛土を行います。       |     |
|              | 排水工                 |      |                 |                 |                 |                 | 盛土造成工事の進捗に合わせて雨水や湧水进行处理する排水工や側溝敷設を行います。     |     |
|              | 南側防災工               |      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 南側調整池の本体を築造するために、工事用道路の造成等を計画中です。           |     |
|              | 南側斜面伐採工<br>(調整池ヤード) |      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 南側調整池の本体築造及び工事用道路造成等を行う為に伐採工事を計画中です。        |     |
|              | 西側盛土法面工             |      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 盛土工事の進捗に合わせ、西側盛土法面の工事を計画中です。                |     |
|              | トンネル岩塊小割工           |      |                 |                 |                 |                 | 経ヶ岳T工事で発生したトンネルの岩塊をブレーカーで盛土に適した大きさに小割を行います。 |     |

3. 発生土搬入工程表

| 作 業 内 容 |      |       | 30年 | 31年  |    |    |    | 備 考     |
|---------|------|-------|-----|------|----|----|----|---------|
|         |      |       | 11月 | 12月迄 | 1月 | 2月 | 3月 |         |
| 工 区     | 経ヶ岳T | A ルート |     |      |    |    |    |         |
|         | 久山T西 | B ルート |     |      |    |    |    |         |
|         | 平山BL | B ルート |     |      |    |    |    | 週3~5回程度 |

※ 各工区の田中町までの運搬経路を裏面に記載しております。

4. 工事写真


盛土箇所全景（北側）



盛土造成箇所（西側より）




盛土造成箇所（東側より）

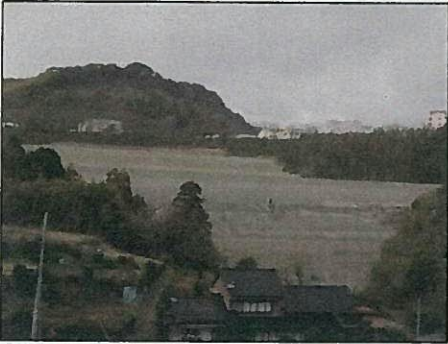

運搬車両の走行については、以下のことを基本に安全運転に努めてまいりますのでご協力をお願いします。  
尚、各JV工区で現地安全確認活動も積極的に行ってまいります。

- 1、一般車優先の誘導及び徐行運転の徹底意識向上
- 2、場内ルールの遵守の徹底及び意識改革
- 3、無駄な騒音・振動を出さない気配り意識の向上

5. 施工場所（平面図）

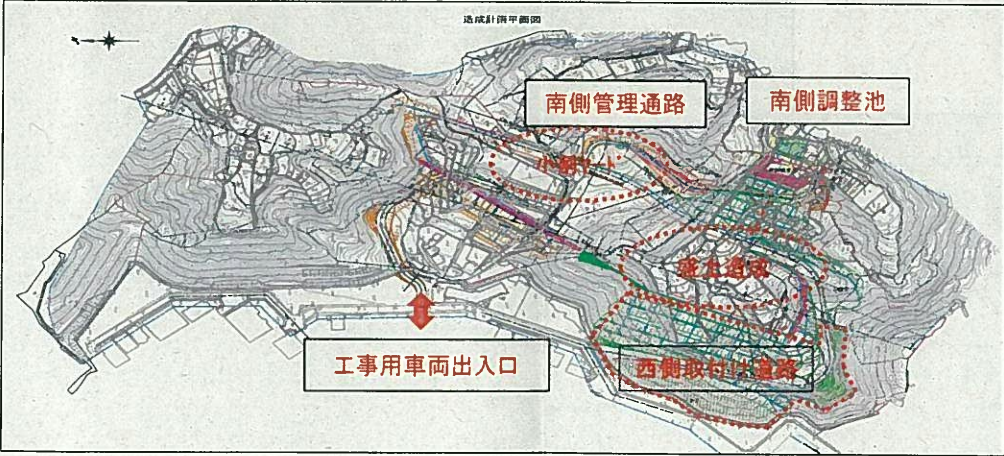

6. 連絡先

- 搬入工区の連絡先  
経ヶ岳T【鉄建JV】 電話 095-894-1651  
久山T西【西松JV】 電話 0957-48-2530  
平山BL【奥村組】 電話 0957-35-8123
- 造成工事に関する事  
鉄道・運輸機構 九州新幹線建設局 電話 095-894-5511  
長崎鉄道建設所
- 企業立地用地整備に関する事  
長崎市 産業雇用政策課 電話 095-829-1313  
長崎市 長崎駅周辺整備室 電話 095-829-1173
- 工事施工者  
鉄建・りんかい日産・西海興業JV 電話 095-894-1651



## 運搬経路図

## 《凡例》

## Alert

経ヶ岳トンネル

往路:   
復路: 

## Bルート

経ヶ岳トンネル

(明かり工事)

久山トンネル(西)

平山BL →

**往路：**

**復路：**

高城台  
ダイレックス 東長崎店

至 経ヶ岳トンネル  
明かり工事

至 久山トンネル (西)

至 平山B L

